



CARNET DE PHASAGE

COMMUNE DE BESNE

CREATION D'UN GIRATOIRE – RD773




Déviation Jour / Phase 1 / Route de Pontchâteau - BESNE



Emprise des travaux



RD773 / Route de Pontchâteau

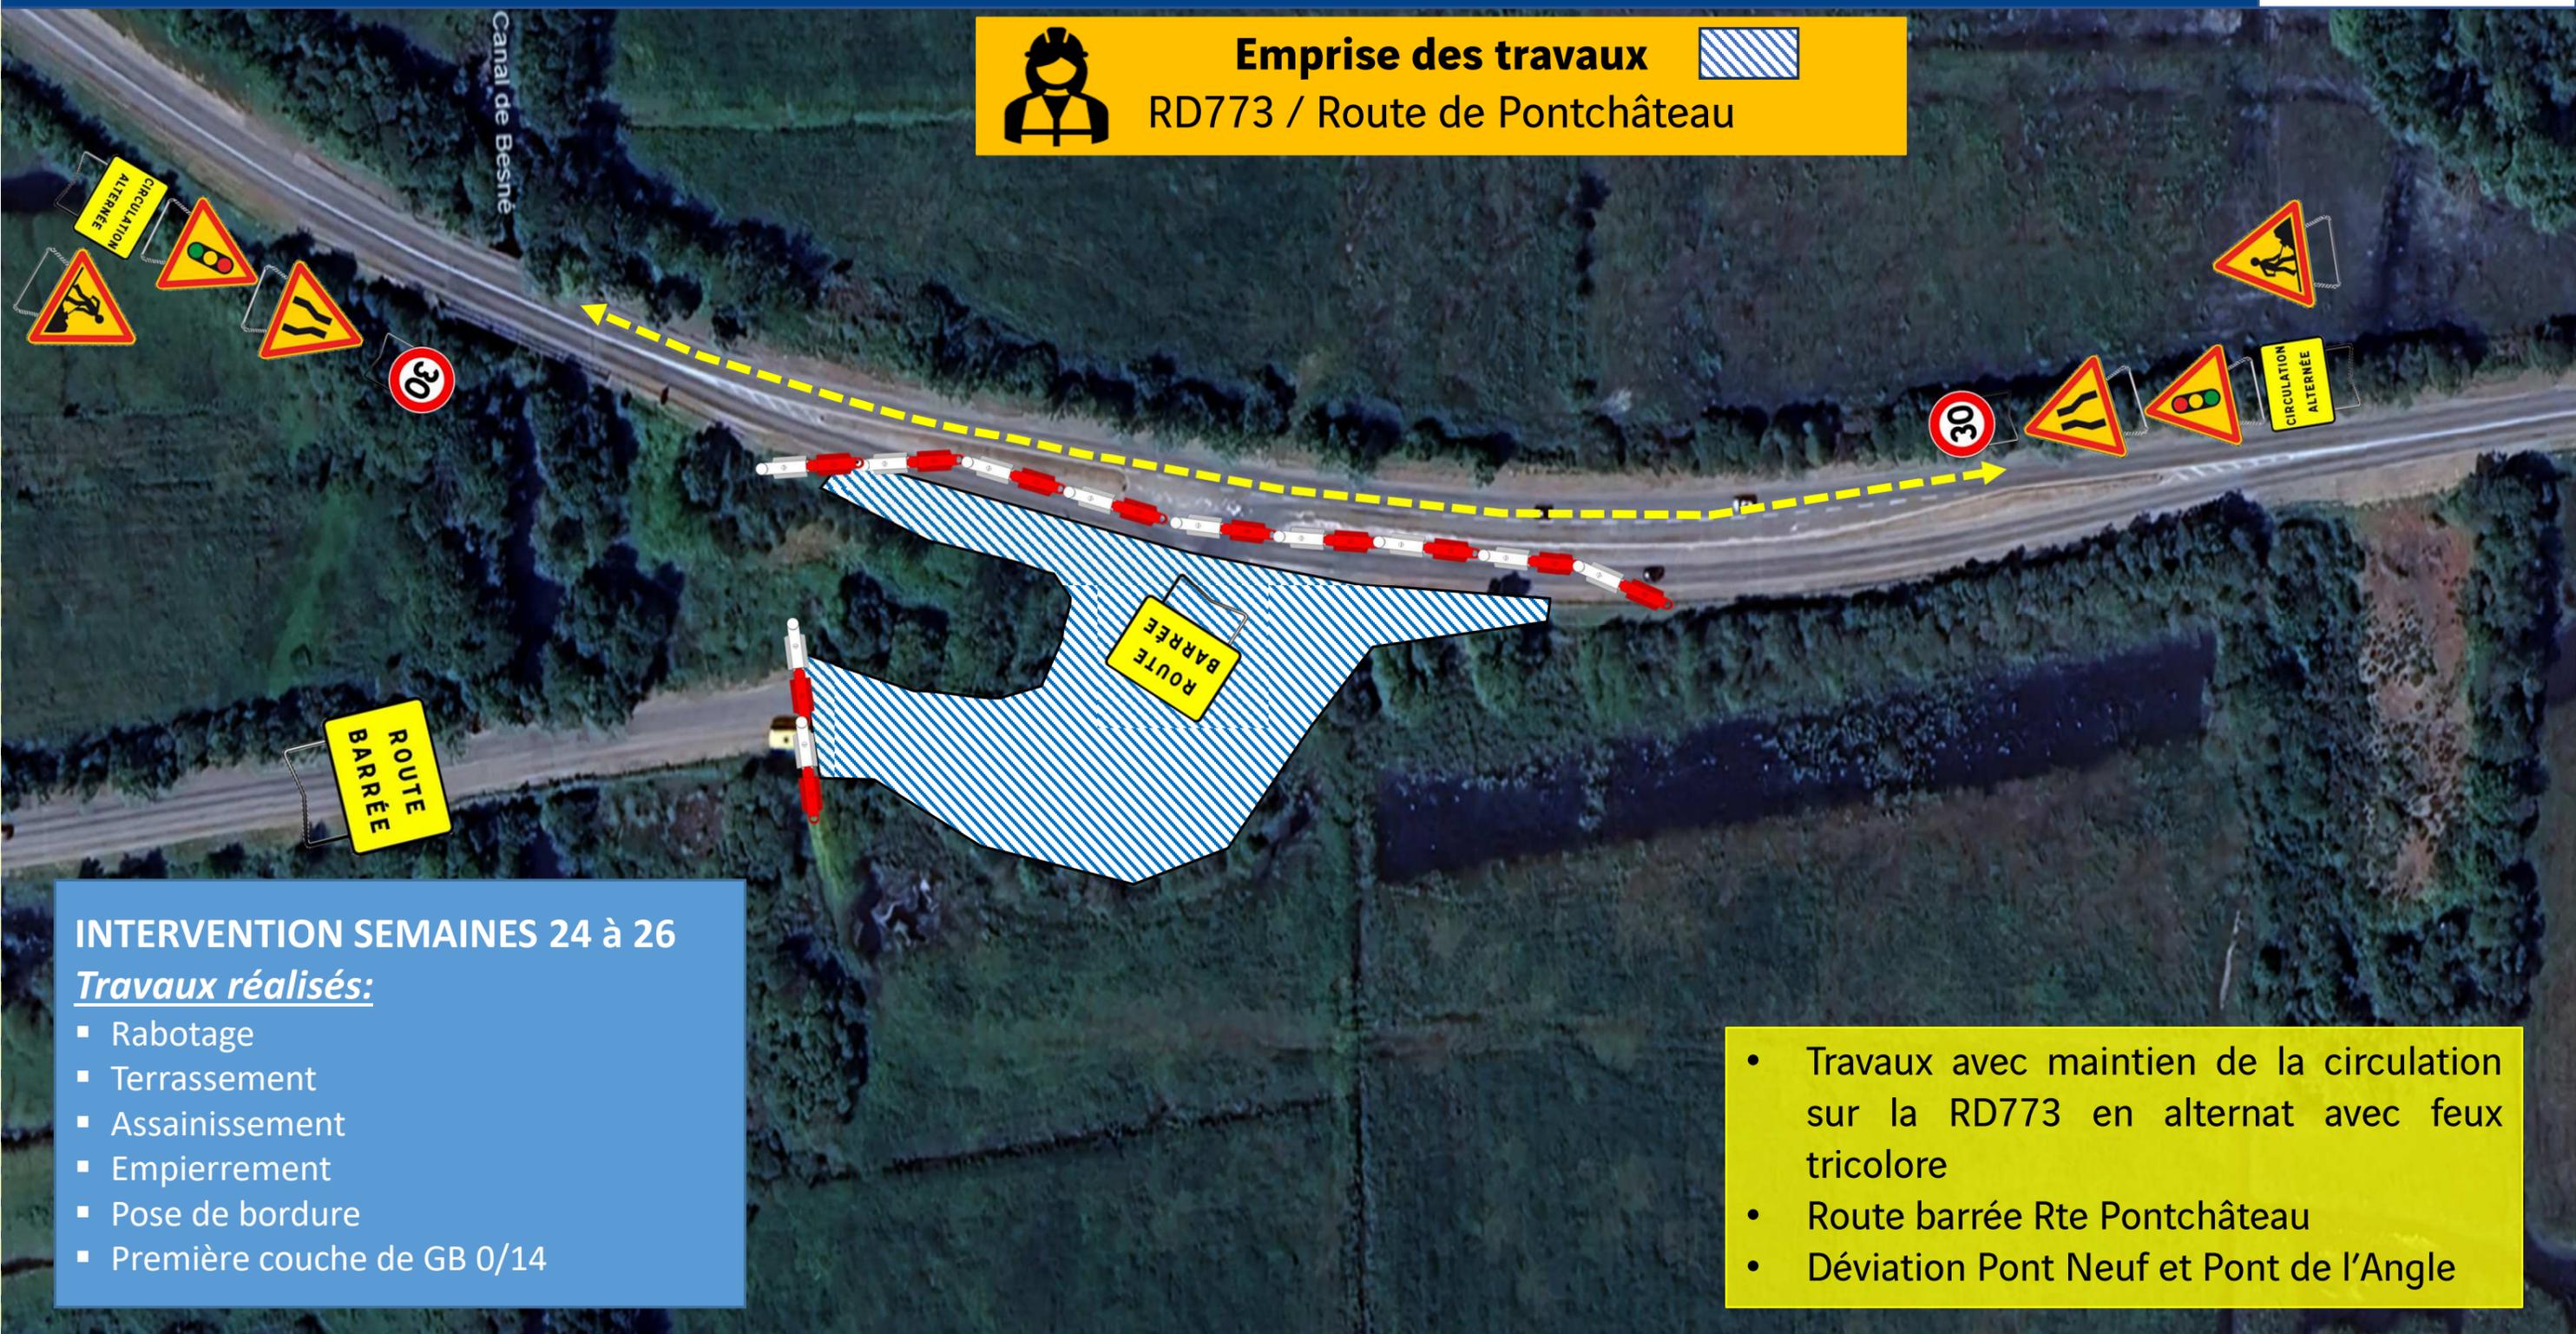

INTERVENTION SEMAINES 24 à 26

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Terrassement
- Assainissement
- Empierrement
- Pose de bordure
- Première couche de GB 0/14

- Travaux avec maintien de la circulation sur la RD773 en alternat avec feux tricolore
- Route barrée Rte Pontchâteau
- Déviation Pont Neuf et Pont de l'Angle

Déviation Jour / PHASE 1 Route de Pontchâteau - BESNE



Emprise des travaux
Route de Pontchâteau




- Travaux avec maintien de la circulation sur la RD773
- Route barrée Rte Pontchâteau
- Itinéraire de déviation
 - Sens sortant par la D204
 - Sens entrant sur la route de St Nazaire

INTERVENTION SEMAINES 24 à 26

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Terrassement
- Assainissement
- Empierrement
- Pose de bordure
- Première couche de GB 0/14

L'itinéraire de déviation sera séparé par un sens entrant et un sens sortant des usagers qui permettra de limiter les nuisances pour les riverains, au cœur de la commune.

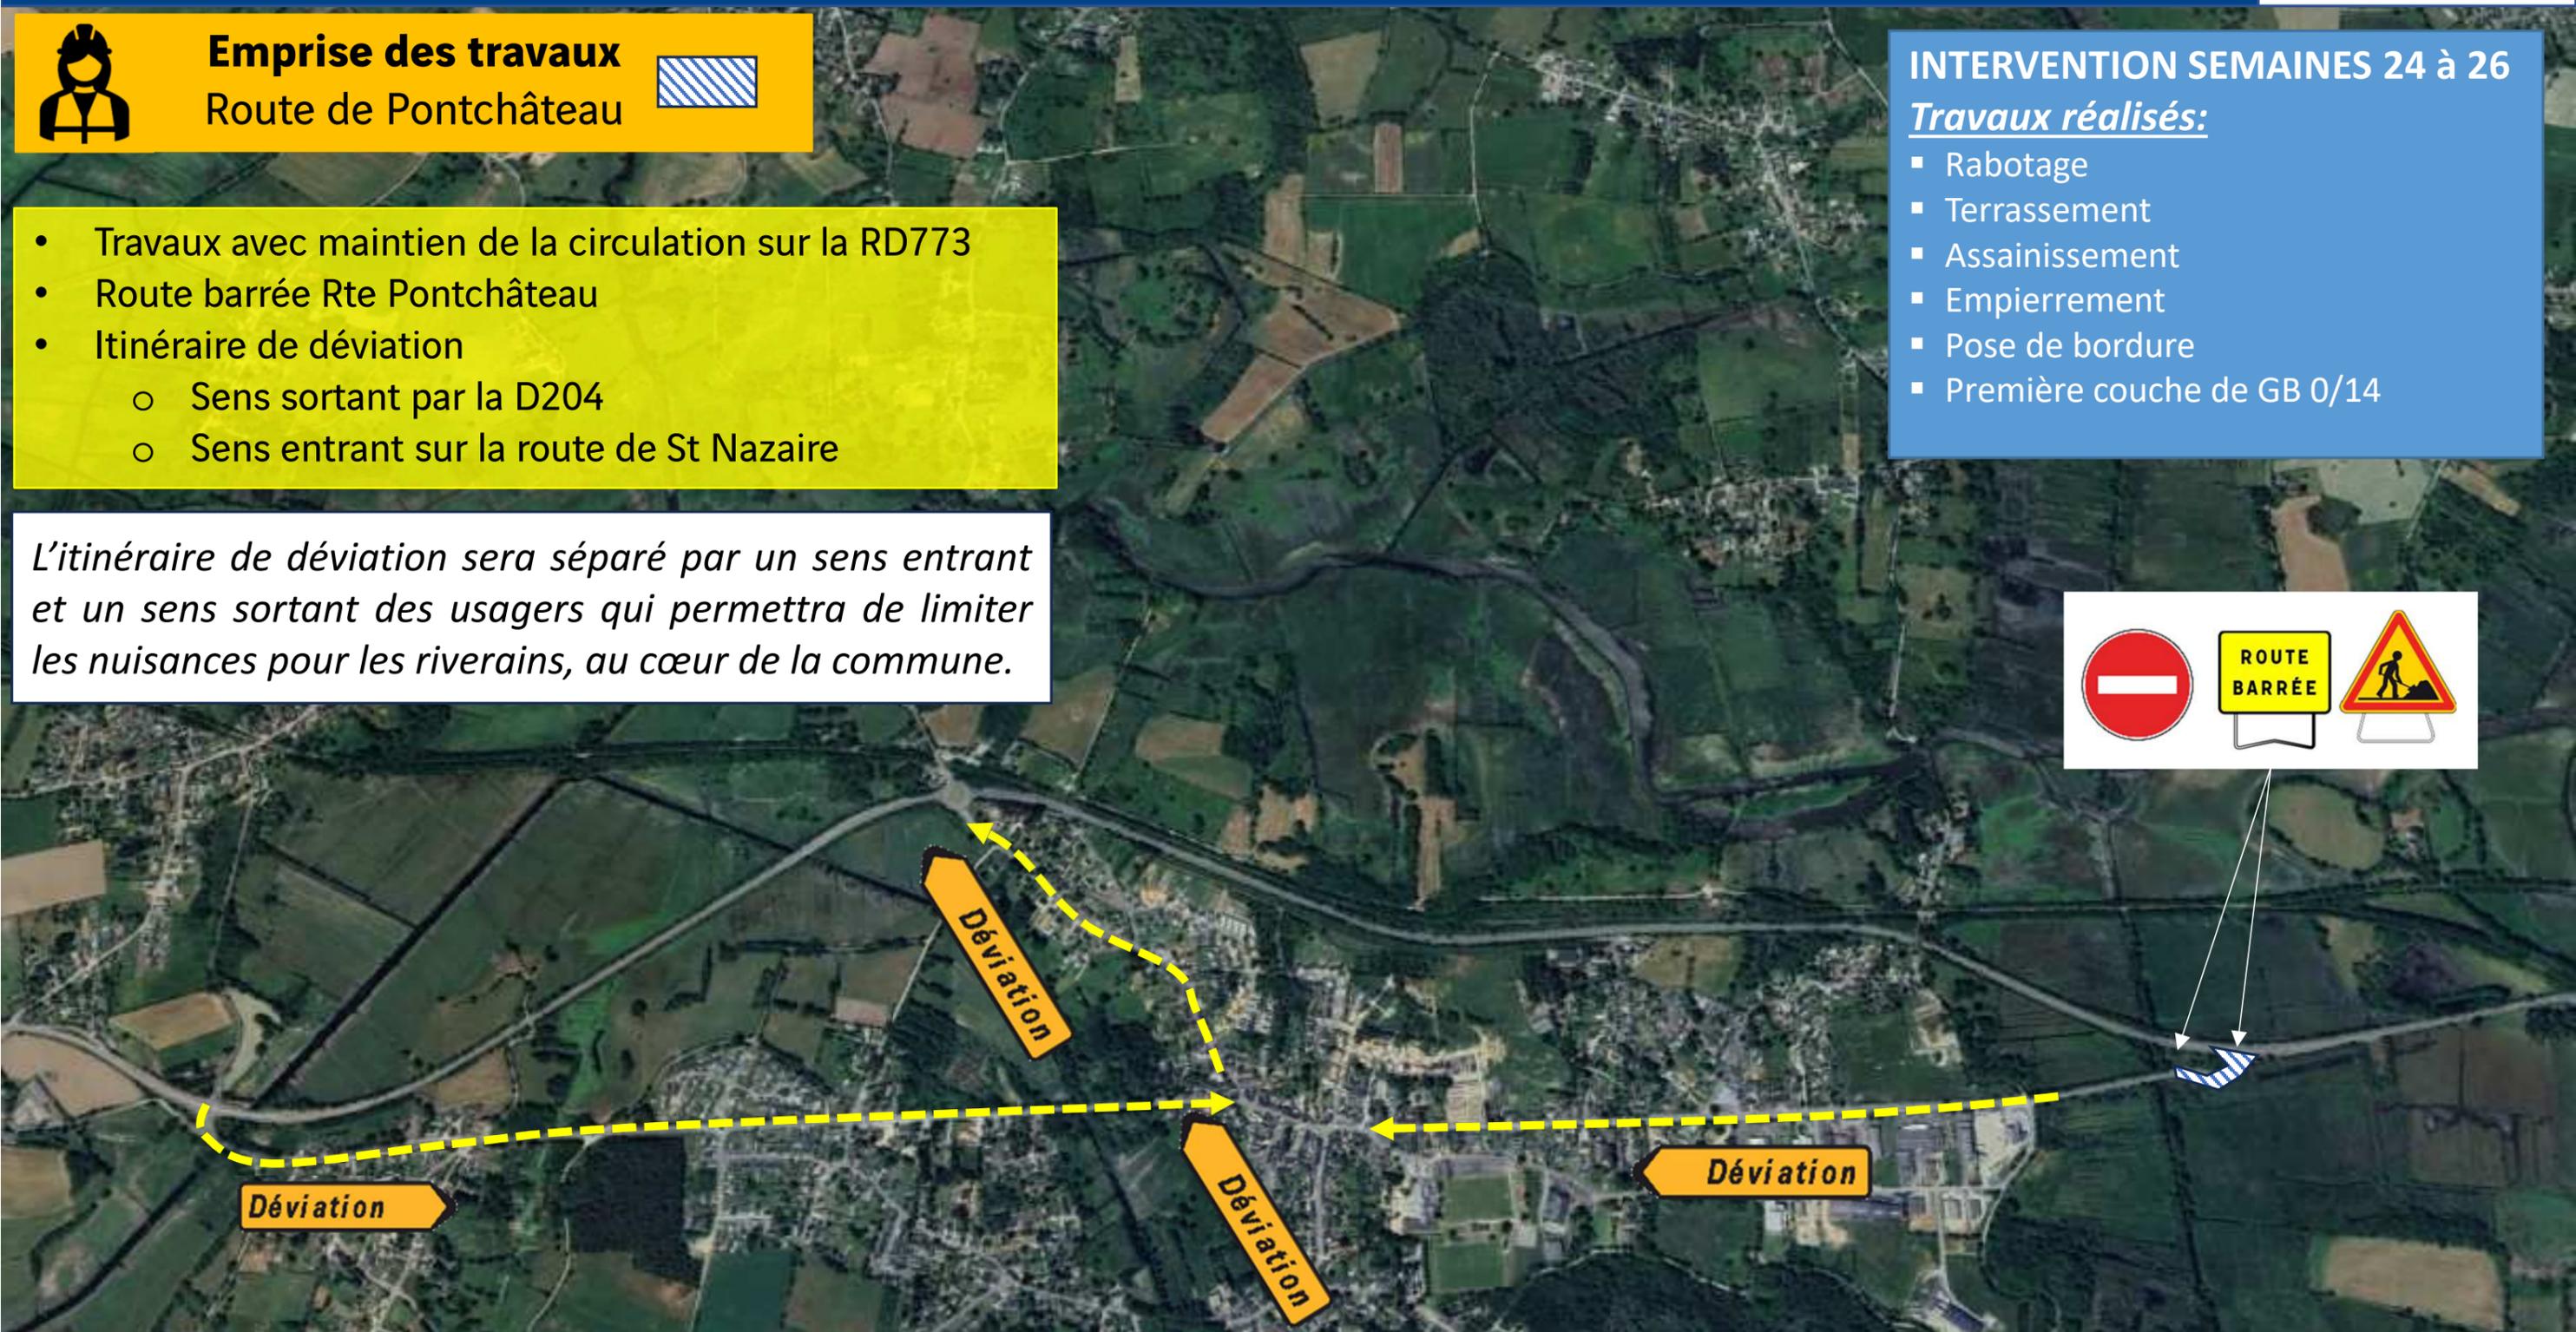

Déviation Jour / PHASE 2 RD773 - BESNE



Emprise des travaux
Route de Pontchâteau



- Travaux avec maintien de la circulation sur la RD773 en alternat avec feux tricolore
- Route barrée Rte Pontchâteau
- Itinéraire de déviation
 - Sens sortant par la D204
 - Sens entrant sur la route de St Nazaire


INTERVENTION SEMAINES 27 à 28

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Terrassement
- Assainissement
- Empierrement
- Pose de bordure
- Première couche de GB 0/14




L'itinéraire de déviation sera séparé par un sens entrant et un sens sortant des usagers qui permettra de limiter les nuisances pour les riverains, au cœur de la commune.

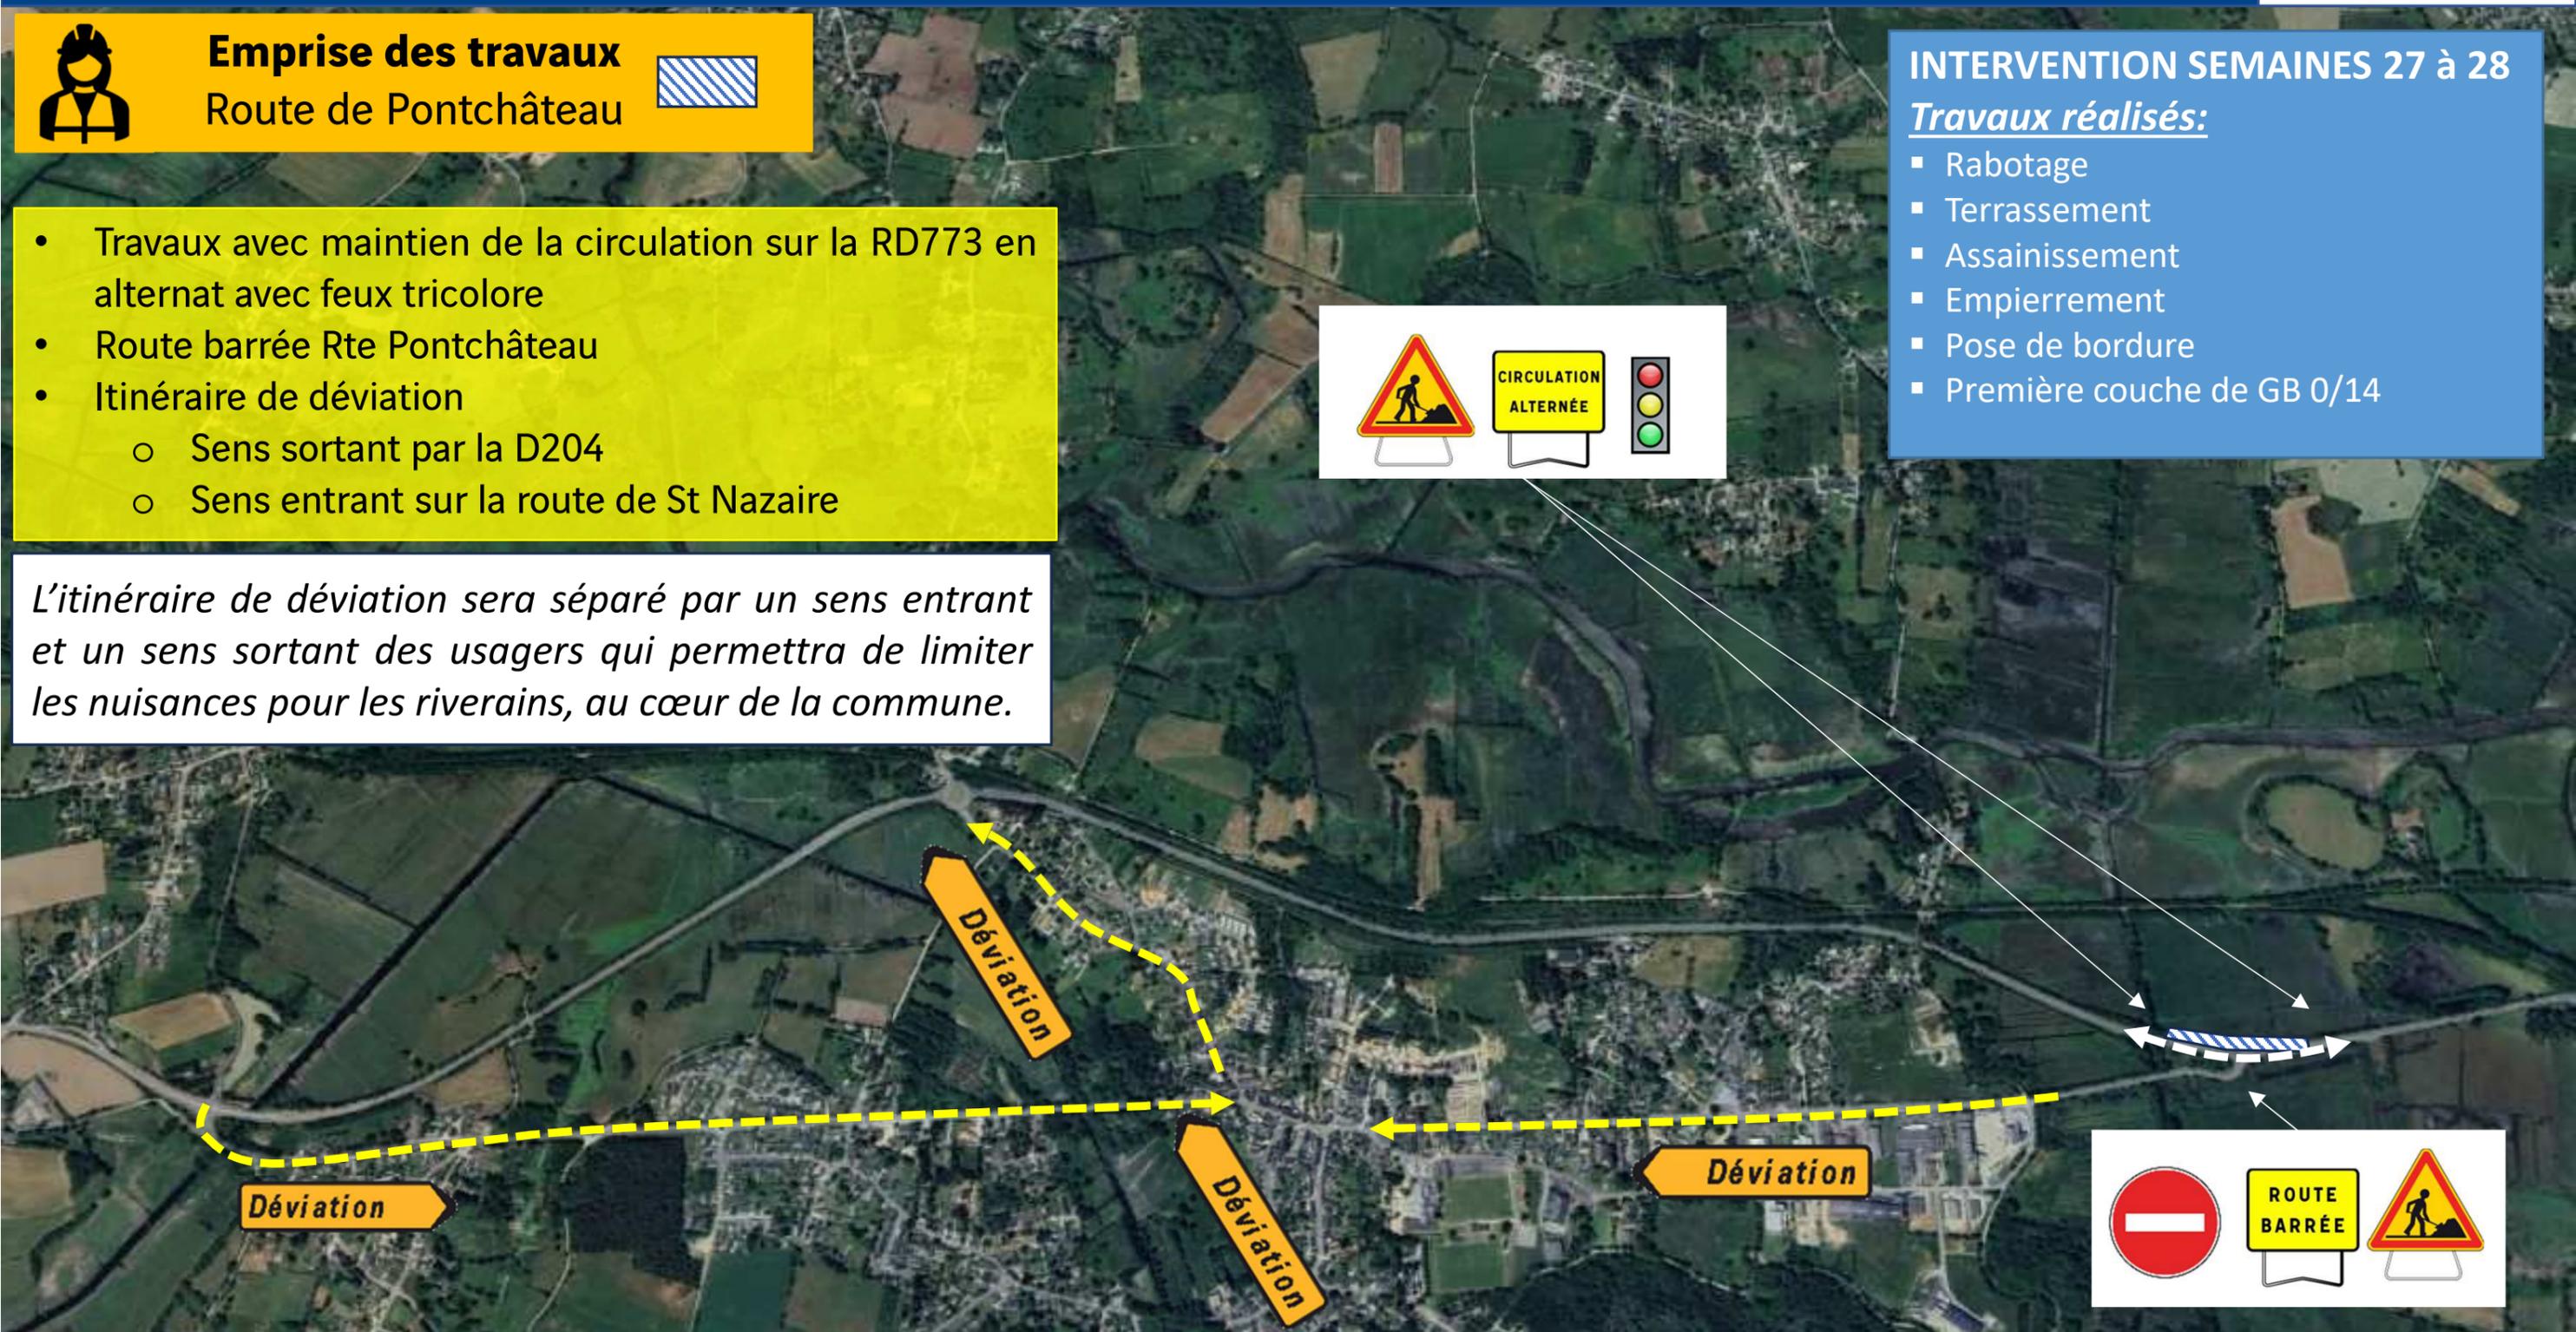



Emprise des travaux

RD773 / Route de Pontchâteau

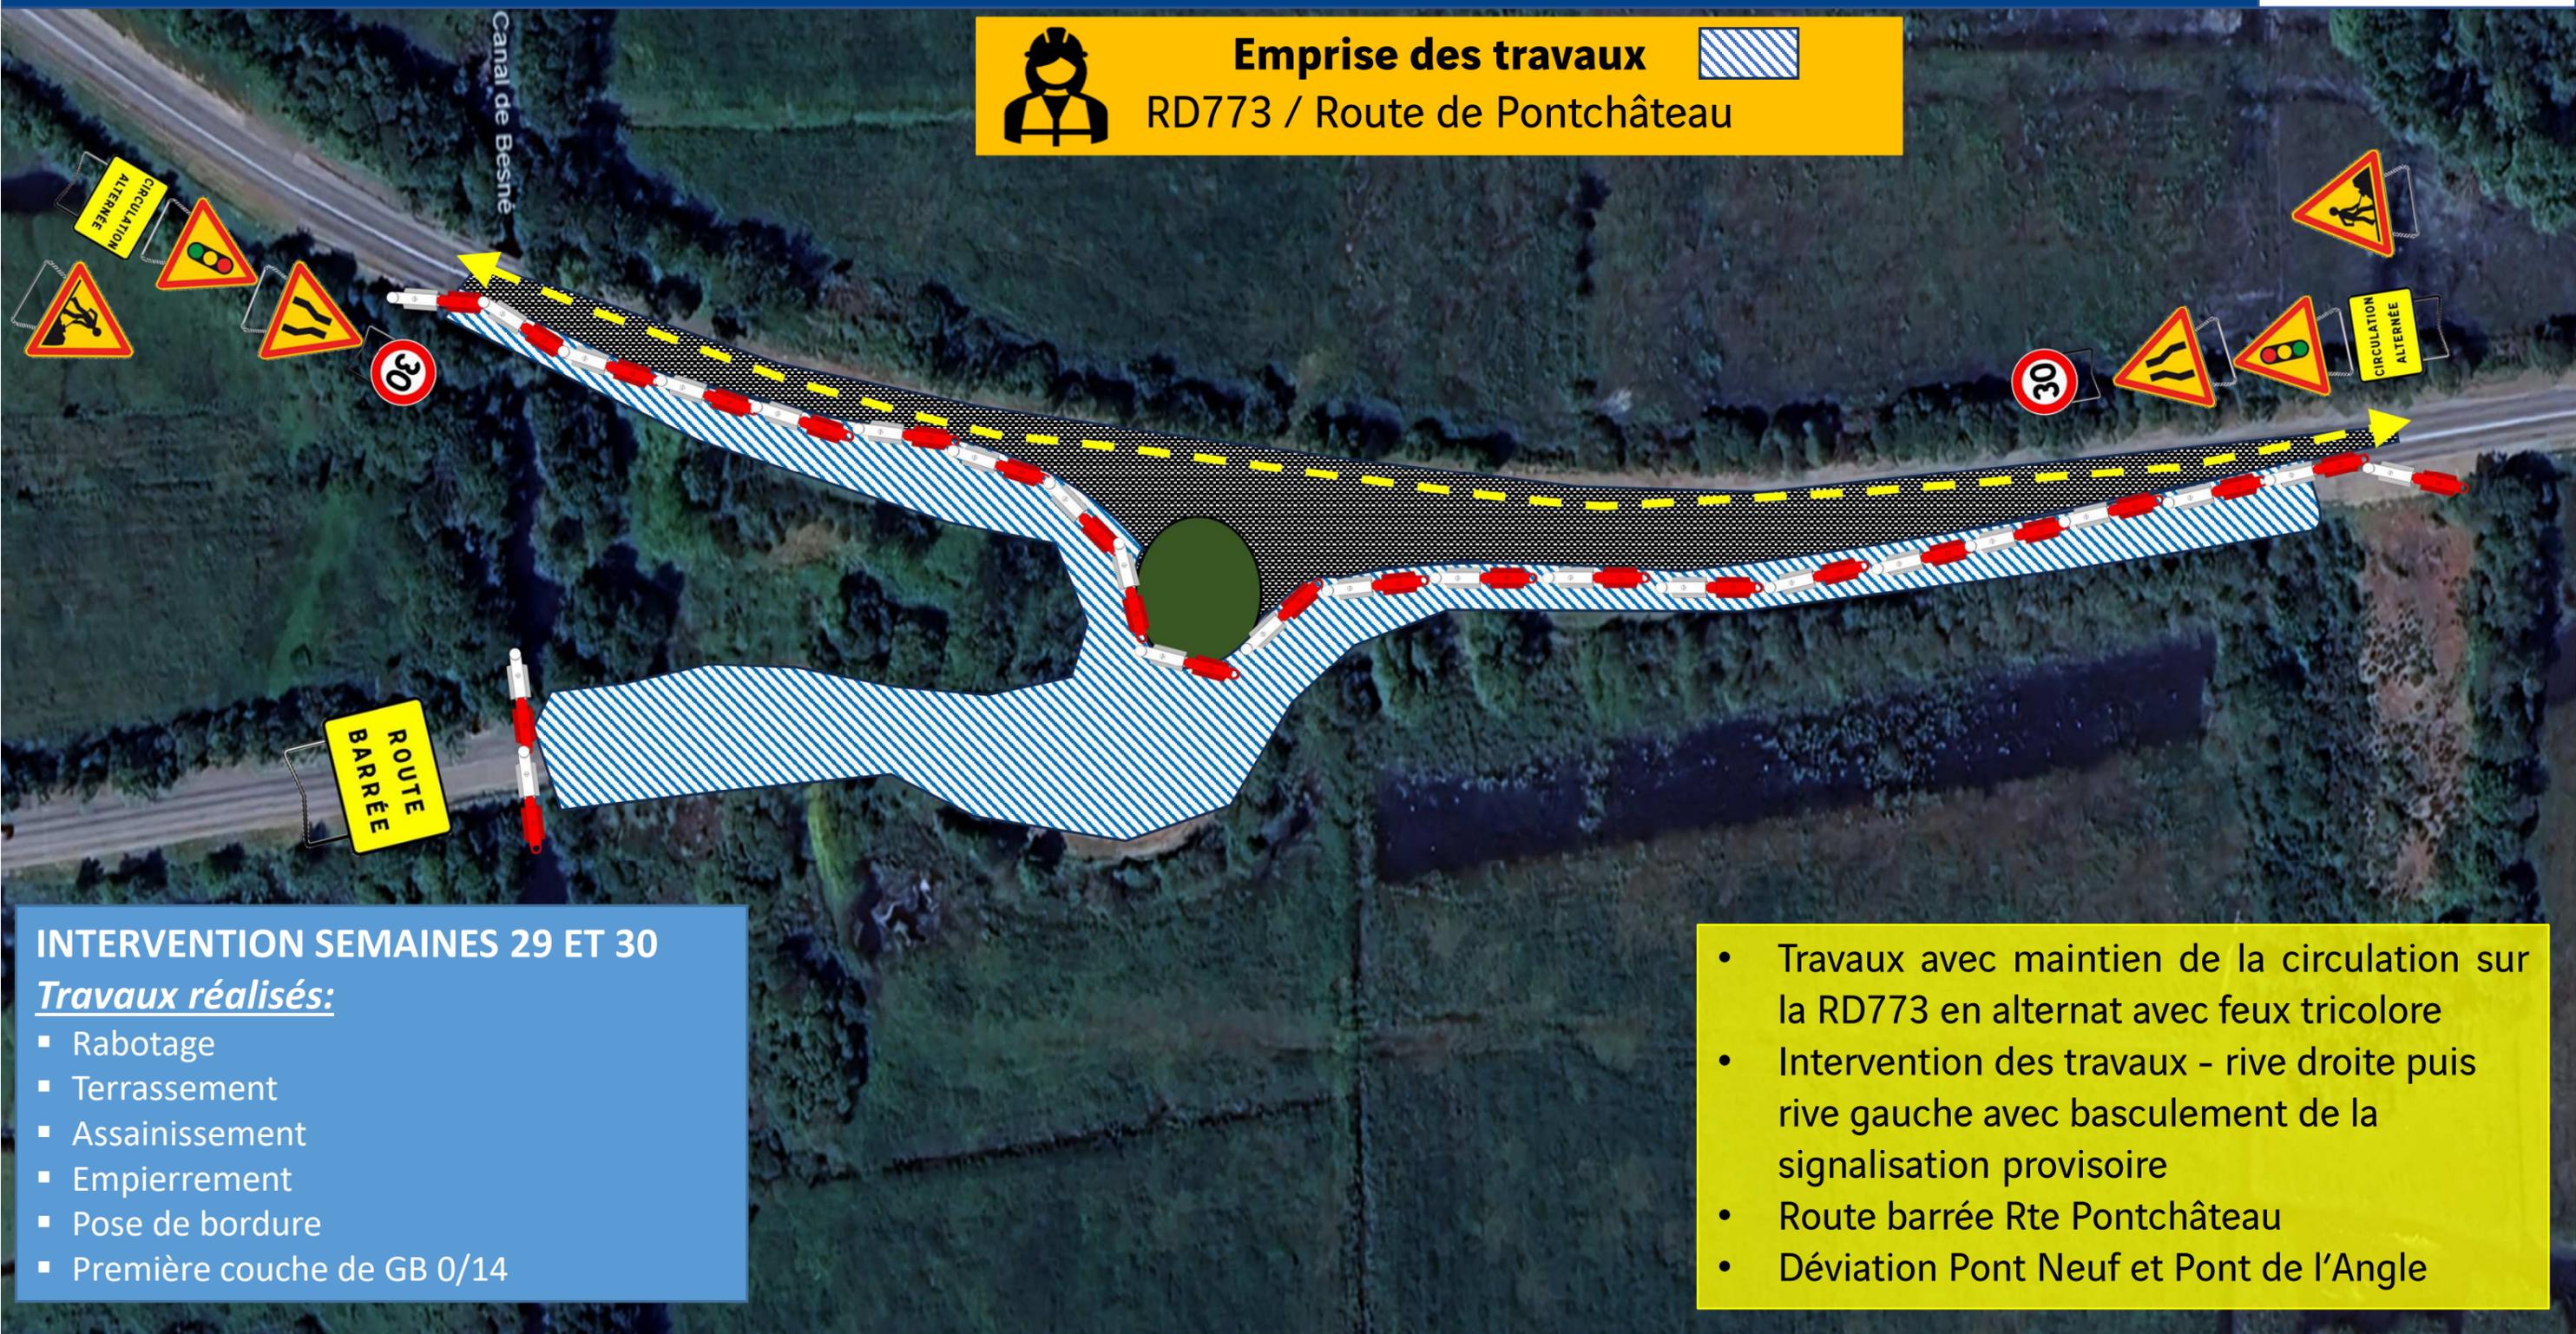

INTERVENTION SEMAINES 29 ET 30

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Terrassement
- Assainissement
- Empierrement
- Pose de bordure
- Première couche de GB 0/14

- Travaux avec maintien de la circulation sur la RD773 en alternat avec feux tricolore
- Intervention des travaux - rive droite puis rive gauche avec basculement de la signalisation provisoire
- Route barrée Rte Pontchâteau
- Déviation Pont Neuf et Pont de l'Angle

Déviation Jour / PHASE 3 D773 - BESNE



Emprise des travaux
Route de Pontchâteau



- Travaux avec maintien de la circulation sur la RD773 en alternat avec feux tricolore
- Route barrée Rte Pontchâteau
- Itinéraire de déviation
 - Sens sortant par la D204
 - Sens entrant sur la route de St Nazaire


INTERVENTION SEMAINES 29 à 30

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Terrassement
- Assainissement
- Empierrement
- Pose de bordure
- Première couche de GB 0/14



L'itinéraire de déviation sera séparé par un sens entrant et un sens sortant des usagers qui permettra de limiter les nuisances pour les riverains, au cœur de la commune.

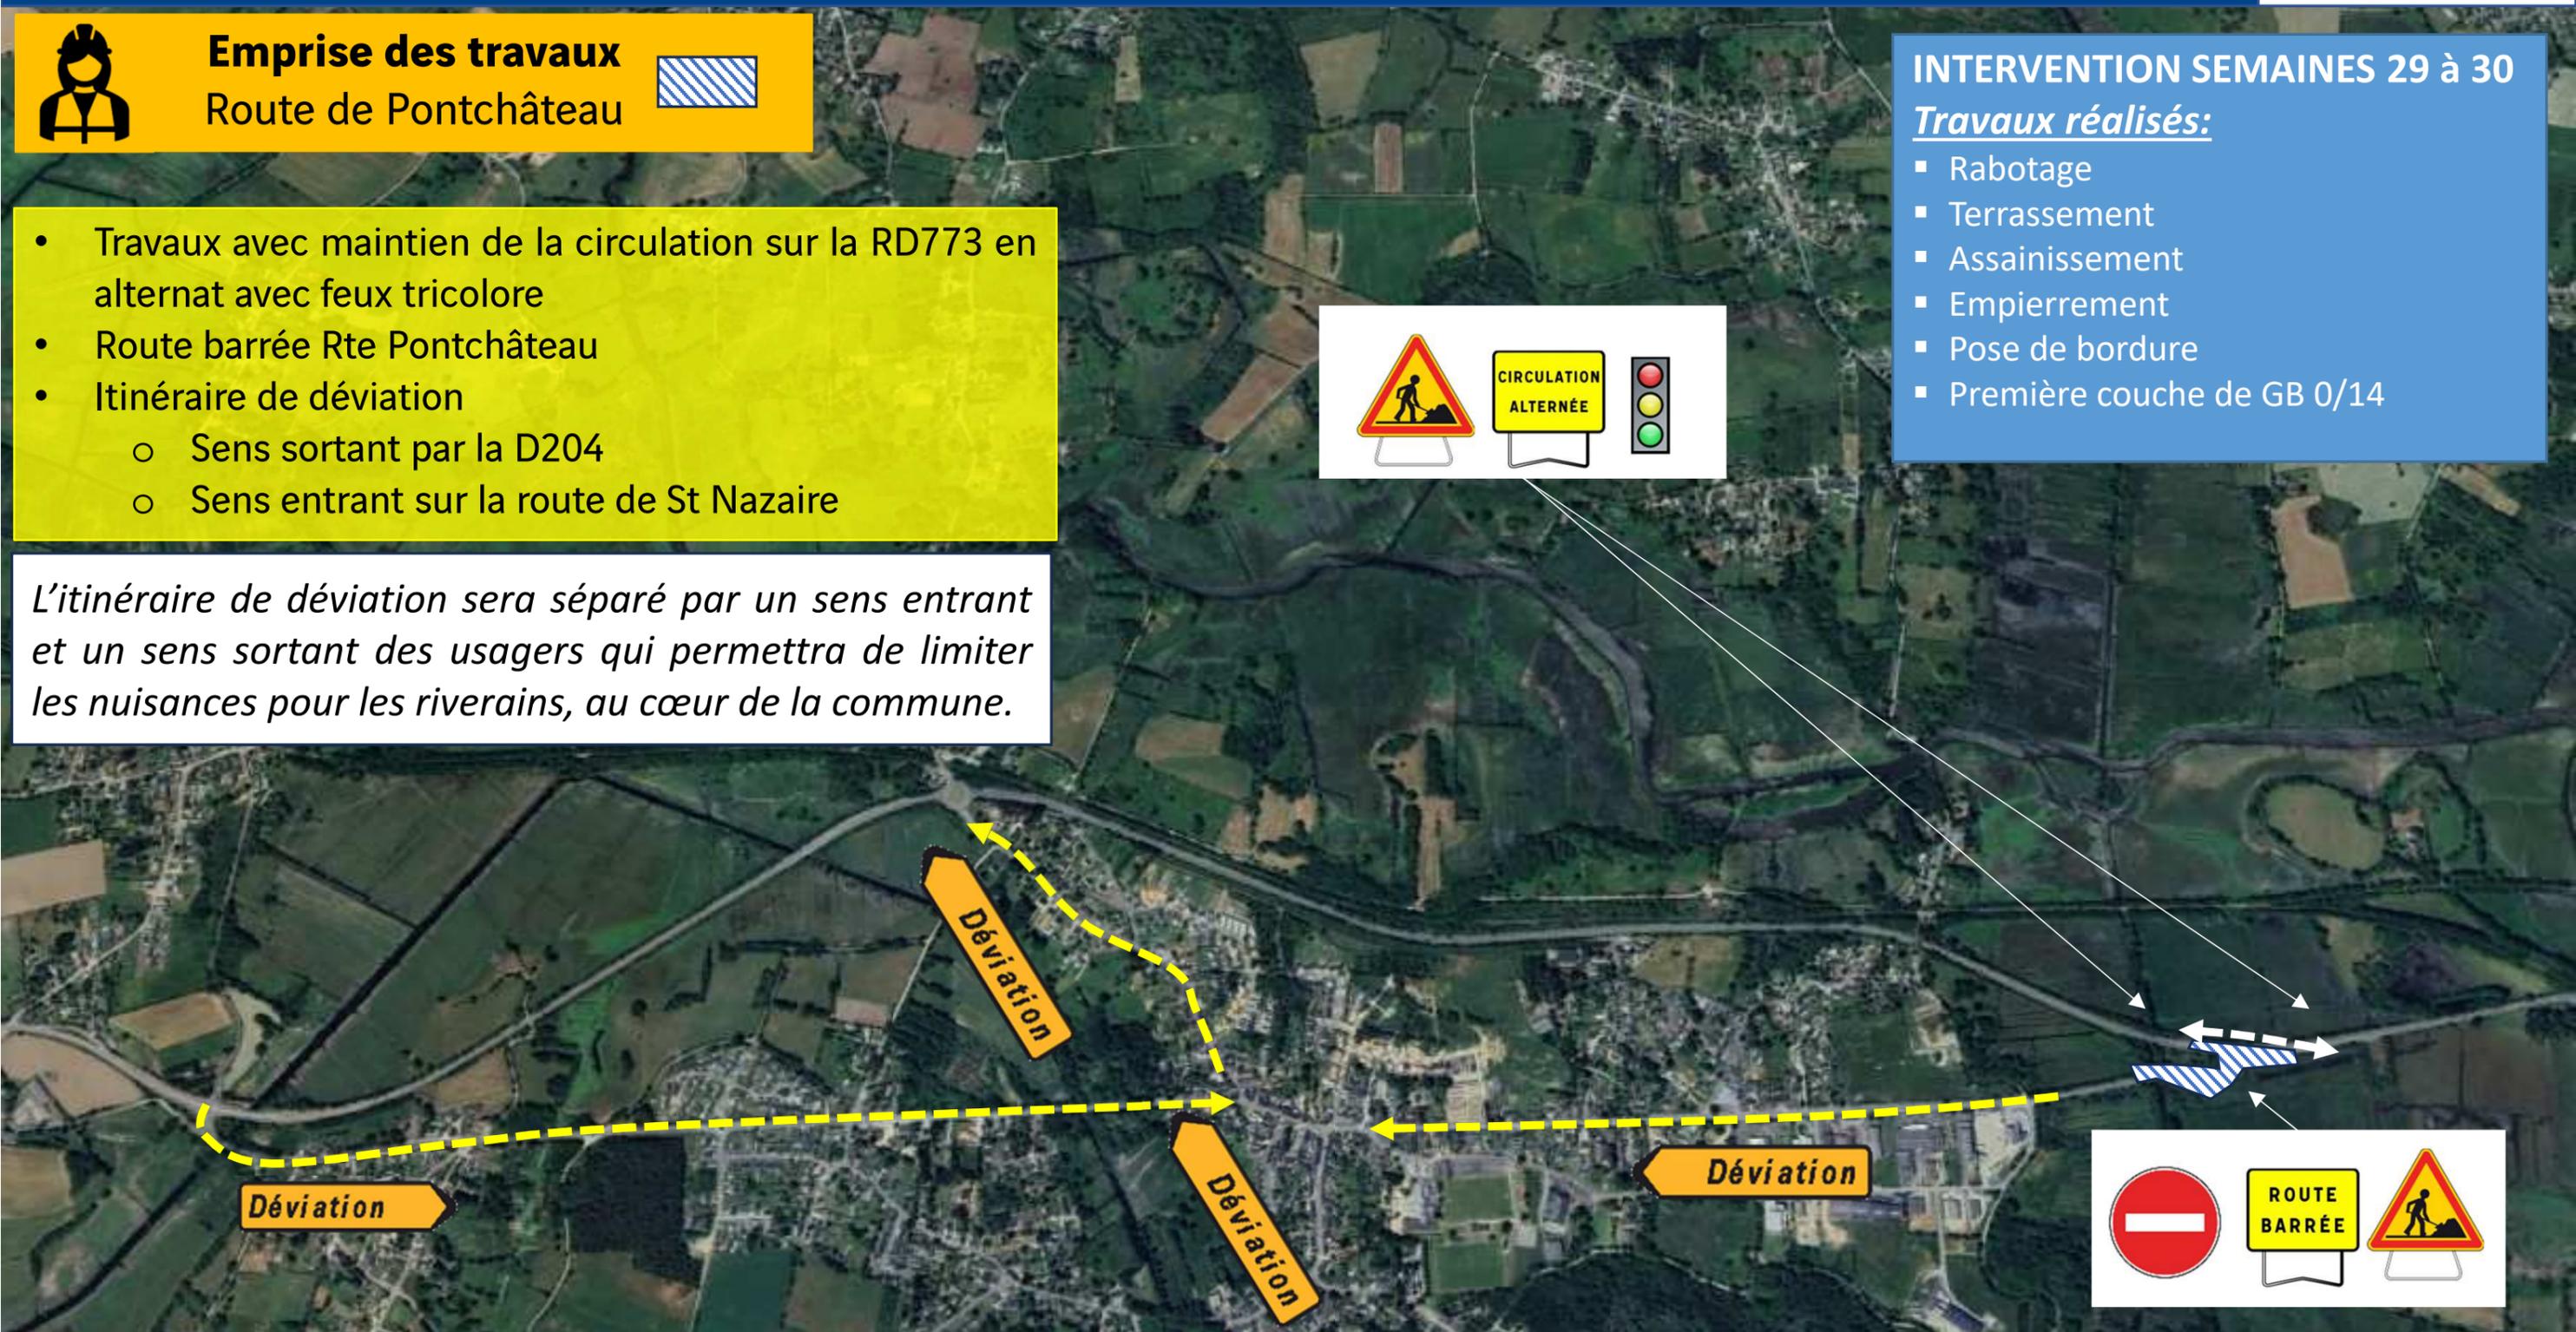

Déviation Nuit VL / Phase 4 / D773 - BESNE



Emprise des travaux
RD773 / Route de Pontchâteau



INTERVENTION 2 NUITS DU 23 AU 24 JUILLET ET DU 24 AU 25 JUILLET DATES A CONFIRMER

Travaux réalisés:

- Rabotage
- Deuxième couche de GB 0/14
- Tapis BBSG 0/10
- Signalisation horizontale et verticale

- **Fermeture complète pendant 2 nuits**
- Proposition de l'itinéraire déviation VL ci-joint
- Installation de lampe tri flash en amont des travaux

